PARGAS KOMMUNOMRÅDE, GRUNDREPARATIONER - PARAISTEN KUNTA-ALUE, PERUSKORJAUKSET 2022

15.11.2022

tarjouspyynnöt | suunnitteluvaihe | tuntityö | urakkatyö | Muutos

Salk u-tus lka	Vastuunjako	Kustan-nuspaikka ja projekti-numero	Kohde	Talousarvio yhteensä €	Toteutuma urakkahinta €, kertymä viikolle 45	Ennuste €	Toteutuma %	
A	JEn,SPi	4123.8446	Koivuhaan päiväkoti / korjaus- ja rakennetiivistyskorjauksia					
			suunnittelu	2 200 €	2 199 €	2 200 €	100 %	RTC Vahanen Oy
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	22 800 €	28 149 €	28 200 €	100 %	Tremex Group Oy, Putkes Oy, Pargas El Ab, Pargas Snickeri, Pract Oy Ab, IMM Palvelut
			Lisäbubjetti/urakkatyö	5 000 €	0 €	5 000 €	100 %	Tremex Group Oy, Putkes Oy, Pargas El Ab, Pargas Snickeri, Pract Oy Ab, IMM Palvelut
			Yhteensä	**30 000 €**	**30 348 €**	**30 400 €**	**100 %**	
A	JEn,SPi	4157.8424	Björkebo/ parvekkeet ja julkisivut					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	10 000 €	13 093 €	13 100 €	100 %	Pargas snickeri, Pract Oy Ab, NP-Yhtiöt, Sundqvist Ronny, Parsep Oy, LSJH Oy, PSL Lindström, Wurth Oy
			Yhteensä	**10 000 €**	**13 093 €**	**13 100 €**	**100 %**	
A	JEn,SPi	4180 8453	Grottan, Kullas/ WC-tilojen saneeraus ja generaattori pakokaasut					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	12 000 €	11 404 €	12 000 €	70 %	Parsep/Oy Drink King, Pargas El, Airiston putkityö, Pract Oy Ab
			Yhteensä	**12 000 €**	**11 404 €**	**12 000 €**	**70 %**	
A	JEn, SPi	4030.8447	Malmin koulu / automaatio, rakennekorjaus					
			Lisäbudjetti/suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	RTC Vahanen
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	25 000 €	4 239 €	25 000 €	17 %	Pargas El, Ahlsell Oy
			Lisäbudjetti/urakkatyö	30 000 €	0 €	30 000 €	0 %	Mattoliike Sepri, Fix Turku Oy
			Yhteensä	**55 000 €**	**4 239 €**	**55 000 €**	**17 %**	
A	JEn, SPi	4150 8432	Paraisten terveyskeskus / portaiden saneeraus, tiivistykset ja iv-saneerauksia					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	45 000 €	34 102 €	45 000 €	76 %	Lumixia Oy, SMM Capital Oy, Mattoliike Sepri, Kaarinan lukko, Airiston putkityö, Pargas El Ab, PSL Lindström, Pract Oy AB, LSJH,Sisustus-Nummi, A-Eristys Oy, Wurth, Arctronic Oy
			Yhteensä	**45 000 €**	**34 102 €**	**45 000 €**	**76 %**	

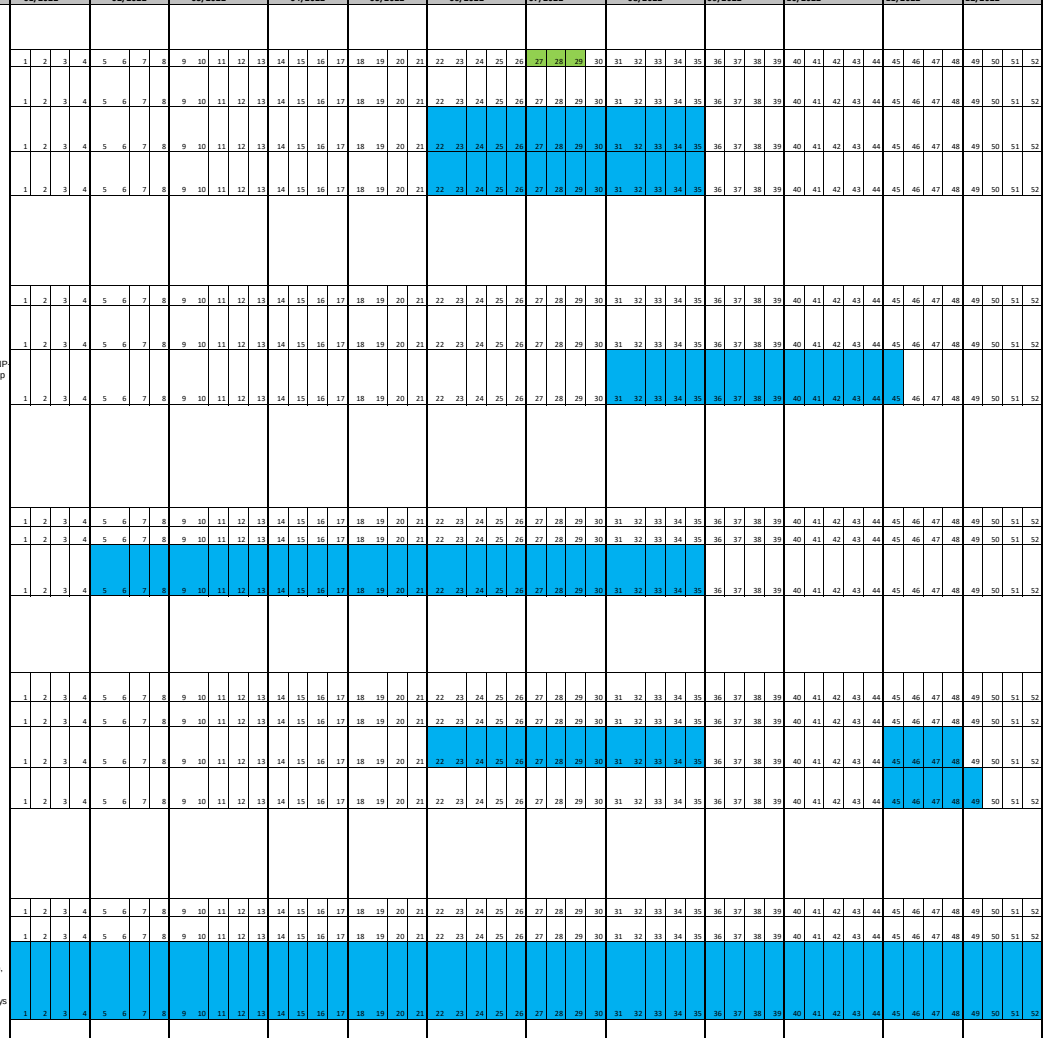

PARGAS KOMMUNOMRÅDE, GRUNDREPARATIONER - PARAISTEN KUNTA-ALUE, PERUSKORJAUKSET 2022

tarjouspyynnöt | suunnitteluvaihe | tuntityö | urakkatyö | Muutos

15.11.2022

Salkuttuslka	Vastuunjako	Kustannuspaikka ja projektinumero	Kohde	Talousarvio yhteensä €	Toteutuma urakkahinta €, kertymä viikolle 45	Ennuste €	Toteutuma %	
A	JEn,SPi	4168 8433	Malmkulla/ Pannuhuoneen saneeraus ja keittiön nostinlaite					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	30 000 €	16 451 €	30 000 €	55 %	Parsep Oy, Fix Turku Oy, Airiston putkityö, Pargas El Ab, Sax Lift A/S-Eksport, J L Pesupalvelu, Putkes Oy, Lumixia
			Yhteensä	**30 000 €**	**16 451 €**	**30 000 €**	**55 %**	
A	JEn,SPi	4149.8454	Hyvinvointikeskus / Lämmönvaihdin ja automatiikka					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	35 000 €	24 096 €	35 000 €	69 %	Pargas El Ab, LVI-asennus Mattila, A-Eristys Oy, Sisustus-Nummi, Turun LVI-instrumento, Schneider Electric FI, Airiston putkityö
			Yhteensä	**35 000 €**	**24 096 €**	**35 000 €**	**69 %**	
A	JEn,SPi	4124.8460	Kirjalan päiväkoti / kattokorjaus					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			Lisäbudjetti/urakkatyö	24 000 €	23 923 €	24 000 €	100 %	Parsep, Fix Turku Oy, Kuiyetus Jorma Winberg, Pract, Pargas Snickeri
			Yhteensä	**24 000 €**	**23 923 €**	**24 000 €**	**100 %**	
A	JEn,SPi	4168.XXXx	Hammashoitola/rakennekorjaus					
			Lisäbudjetti/suunnittelu	8 000 €	7 754 €	8 000 €	100 %	Granlund Turku, RTC Vahanen
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			Lisäbudjetti/urakkatyö	52 000 €	17 826 €	52 000 €	34 %	Tremex Group
			Yhteensä	**60 000 €**	**25 580 €**	**60 000 €**	**34 %**	
A	JEn,SPi	4070.XXXx	Koivuhaan koulu/lkkuna- ja wc-tilakorjaukset					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			Lisäbudjetti/urakkatyö	80 000 €	0 €	80 000 €	0 %	
			Yhteensä	**80 000 €**	**0 €**	**80 000 €**	**0 %**	
			Kaikki yhteensä	**381 000 €**	**183 237 €**	**384 500 €**	**62 %**	**Kokonaistoteutuma**

Salkut

lka	Käyttötarkoitus
A	Pidettävät rakennukset
B	Kehitettävät rakennukset
C	Realisoitavat eli myytävät rakennukset
C+	Realisoitavat tai käyttötarkoituksen muutos
D	Purettavat rakennukset
