PARGAS KOMMUNOMRÅDE, GRUNDREPARATIONER - PARAISTEN KUNTA-ALUE, PERUSKORJAUKSET 2023

14.11.2023

tarjouspyynnöt | suunnitteluvaihe | tuntityö | urakkatyö | Muutos

Salkutus Ika	Vastuunjako	Kustannuspaikka ja projektinumero	Kohde	Talousarvio+ TAlisäbudjetti yhteensä €	Toteutuma urakkahinta €, kertymä viikolle 46	Ennuste €	Toteutuma %	
A	JEn,SPi	**4020.8402**	Kaupungintalo/ korjaus- ja rakennetiivistyskorjauksia					
			suunnittelu	1 800 €	4 695 €	4 700 €	100 %	Afry Buildings Finland, inststo Juhani Lehtonen Oy
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	78 200 €	78 200 €	78 200 €	99 %	Tremex Group, LSJH, Parsep/Oy Drink-King Ab, Pract, Fix Turku Oy, Pargas El Ab, Coor service management Oy, KLV-Palvelu, AFRY
			Lisäbudjetti/urakkatyö	60 000 €	64 487 €	64 500 €	99 %	Tremex Group, LSJH, Parsep/Oy Drink-King Ab, Pract, Fix Turku Oy, Pargas El Ab, Coor service management Oy, KLV-Palvelu, AFRY
			Yhteensä	**140 000 €**	**147 381 €**	**147 400 €**	**99 %**	
A	JEn,SPi	**4154.8465**	Kombila/vesikatto ja rakennekorjauksia					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö /vesikatto	65 000 €	65 000 €	65 000 €	100 %	Turku Fix Oy, Renta Telineet Oy, Pract Oy Ab, Rakentajan Sarokas Oy, Ovitehdas Vihanto Oy, HL-Metal Oy Ab, Airiston putkityö Oy, Kattotyö Jari Virta Oy, AFRY, Tremex Group buildings Finland Oy, Sundqvist Ronny grävmaskin, IMM Palvelut, LSJH,Liedon peltiasema Oy, Pargas El, Rak.inststo Keskitalo,Wurth,Parsep, Tremex Group Oy
			Lisäbudjetti/urakkatyö, vesikatto	50 000 €	61 183 €	61 200 €	100 %	Turku Fix Oy, Renta Telineet Oy, Pract Oy Ab, Rakentajan Sarokas Oy, Ovitehdas Vihanto Oy, HL-Metal Oy Ab, Airiston putkityö Oy, Kattotyö Jari Virta Oy, AFRY, Tremex Group buildings Finland Oy, Sundqvist Ronny grävmaskin, IMM Palvelut, LSJH,Liedon peltiasema Oy, Pargas El, Rak.inststo Keskitalo,Wurth,Parsep, Tremex Group Oy
			Yhteensä	**115 000 €**	**126 183 €**	**126 200 €**	**100 %**	
A	JEn,SPi	**4123.8446**	Koivuhaan päiväkoti/rakennetiivistyskorjauksia					
			suunnittelu	3 000 €	2 878 €	3 000 €	100 %	Afry Buildings Finland Oy
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö/rakennetiivistyskorjauksia	32 000 €	53 678 €	54 000 €	100 %	IMM Palvelut, Tremex Group Oy, Plåtslageri Lindström, Pargas El, Pract
			Yhteensä	**35 000 €**	**56 556 €**	**57 000 €**	**100 %**	

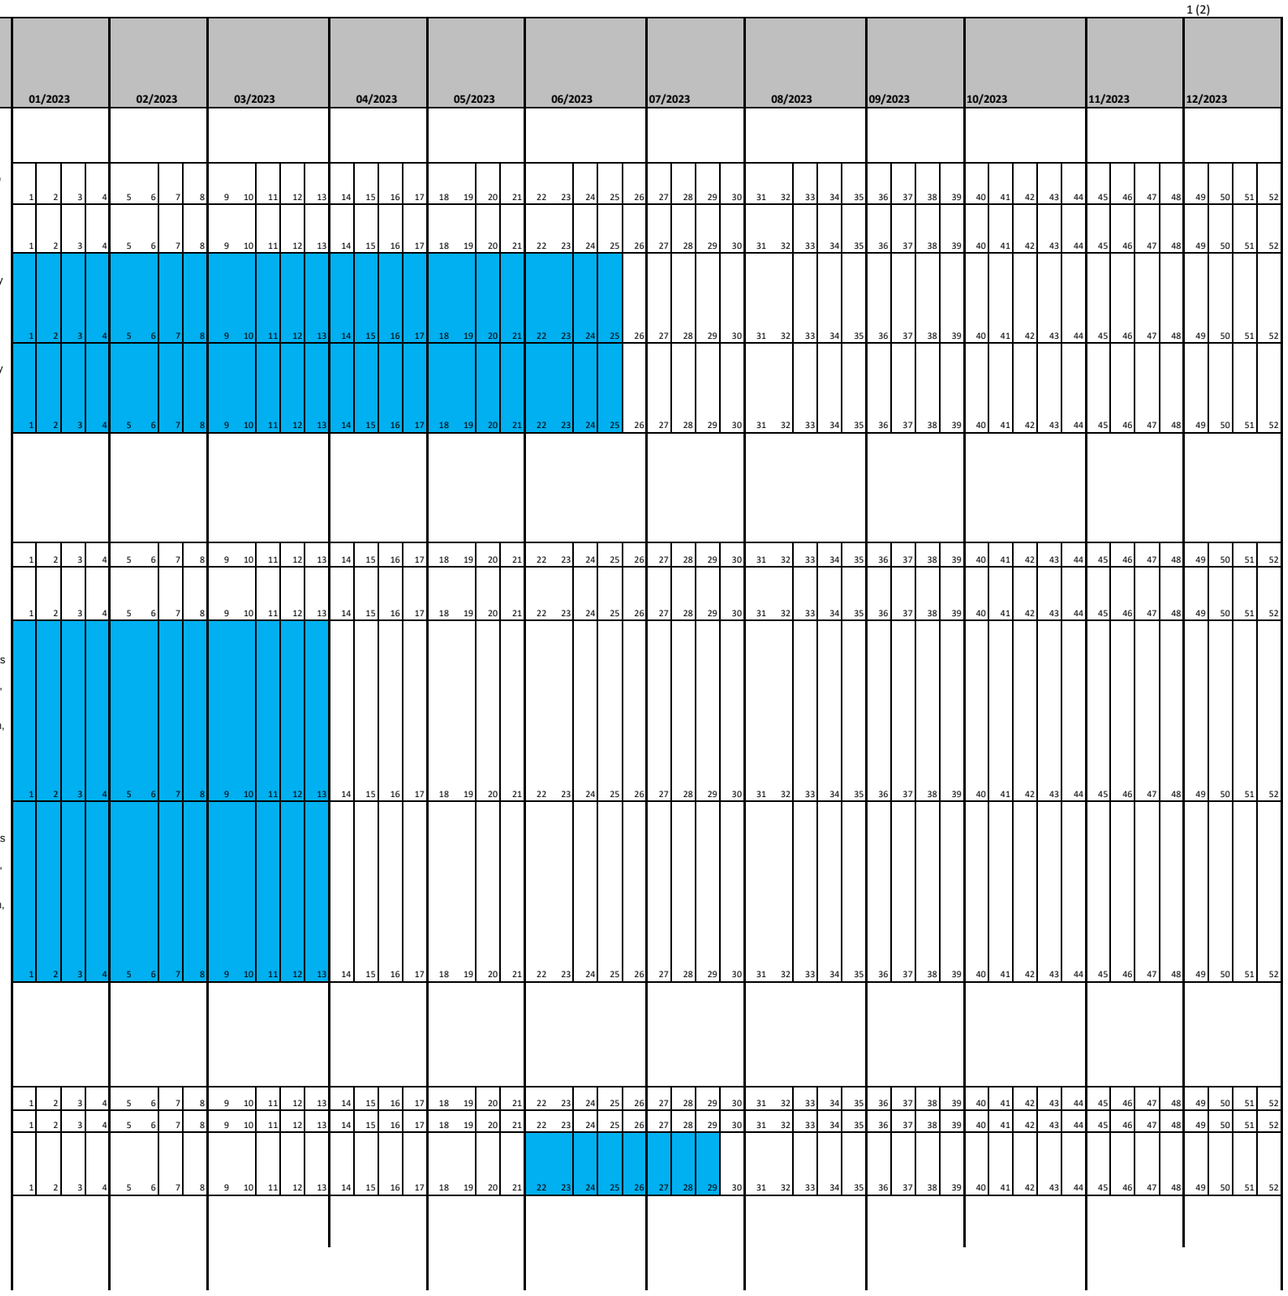

PARGAS KOMMUNOMRÅDE, GRUNDREPARATIONER - PARAISTEN KUNTA-ALUE, PERUSKORJAUKSET 2023

14.11.2023

tarjouspyynnöt | suunnitteluvaihe | tuntityö | urakkatyö | Muutos

Salkutus lka	Vastuunjako	Kustannuspaikka ja projektinumero	Kohde	Talousarvio+TA lisäbudjetti yhteensä €	Toteutuma urakkahinta €, kertymä viikolle 46	Ennuste €	Toteutuma %	
A	JEn, SPi	4030.8447	Malmin koulu / automaatio+ korjaussuunnittelu ja kuntokartoitus					
			suunnittelu	0 €	3 992 €	0 €	100 %	Afry Buildings Finland Oy
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö/automaatio	15 000 €	15 000 €	15 000 €	100 %	Pargas El Ab, Plåtslageri Lindström, ES-support, Airon Oy
			Siirto kohteesta Paraisten terveyskeskus, urakkatyö/korjaussuunnittelu ja kuntokartoitus	10 000 €	6 992 €	10 000 €		Airon Oy
			Siirto kohteesta Malmkulla, urakkatyö/korjaussuunnittelu ja kuntokartoitus	3 000 €	0 €	3 000 €		
			Siirto kohteesta Sateenkaari/Korppoo, urakkatyö/korjaussunnittelu ja kuntokartoitus	5 000 €	0 €	5 000 €		
			Siirto kohteesta Iniön koulu, urakkatyö/korjaussuunnittelu ja kuntokartoitus	3 000 €	0 €	3 000 €		
			Siirto kohteesta Iniö Snäckan, urakkatyö/korjaussuunnittelu ja kuntokartoitus	3 000 €	0 €	3 000 €		
			Yhteensä	**39 000 €**	**25 984 €**	**39 000 €**	**28 %**	
A	JEn, SPi	4150.8432	Paraisten terveyskeskus / tiivistykset					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	20 000 €	5 381 €	10 000 €	49 %	Turun Rakennuspalvelu, Stark Suomi Oy, SMM Capital Oy, Wurth Oy
			Siirto 10 000€ Malmin koulun korjaussuunnittelu ja kuntokartoitus	-10 000 €				
			Yhteensä	**10 000 €**	**5 381 €**	**10 000 €**	**49 %**	
A	JEn,SPi	4168.8433	Malmkulla/ keittiön nostinlaite					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	10 000 €	726 €	7 000 €	34 %	Wurth Oy, Pargas Snickeri Ab
			urakkatyö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			Siirto 3 000€ Malmin koulun korjaussuunnittelu ja kuntokartoitus	-3 000 €				
			Yhteensä	**7 000 €**	**726 €**	**7 000 €**	**34 %**	
A	JEn,SPi	4124.8460	Kirjalan päiväkoti / kattokorjaus					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	60 000 €	60 000 €	60 000 €	75 %	Trafino Oy, Pract, Parsep/Oy Drink King AB,FIX Turku, Liedon peltiasema Oy, Kuljetus Jorma Winberg, Pract, Wurth, Stefan Ekblad Ab Oy
			Lisäbudjetti/urakkatyö, kattokorjaus	10 724 €	7 794 €	7 800 €	75 %	Trafino Oy, Pract, Parsep/Oy Drink King AB,FIX Turku, Liedon peltiasema Oy, Kuljetus Jorma Winberg, Pract, Wurth, Stefan Ekblad Ab Oy
			Yhteensä	**70 724 €**	**67 794 €**	**67 800 €**	**75 %**	
A	JEn,SPi	4047.8466	Kirjalan koulu/huoltomaalaus					
			suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
			tuntityö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			urakkatyö	12 000 €	11 360 €	12 000 €	100 %	Kirjalan Maalauspalvelu Oy
			Yhteensä	**12 000 €**	**11 360 €**	**12 000 €**	**100 %**	

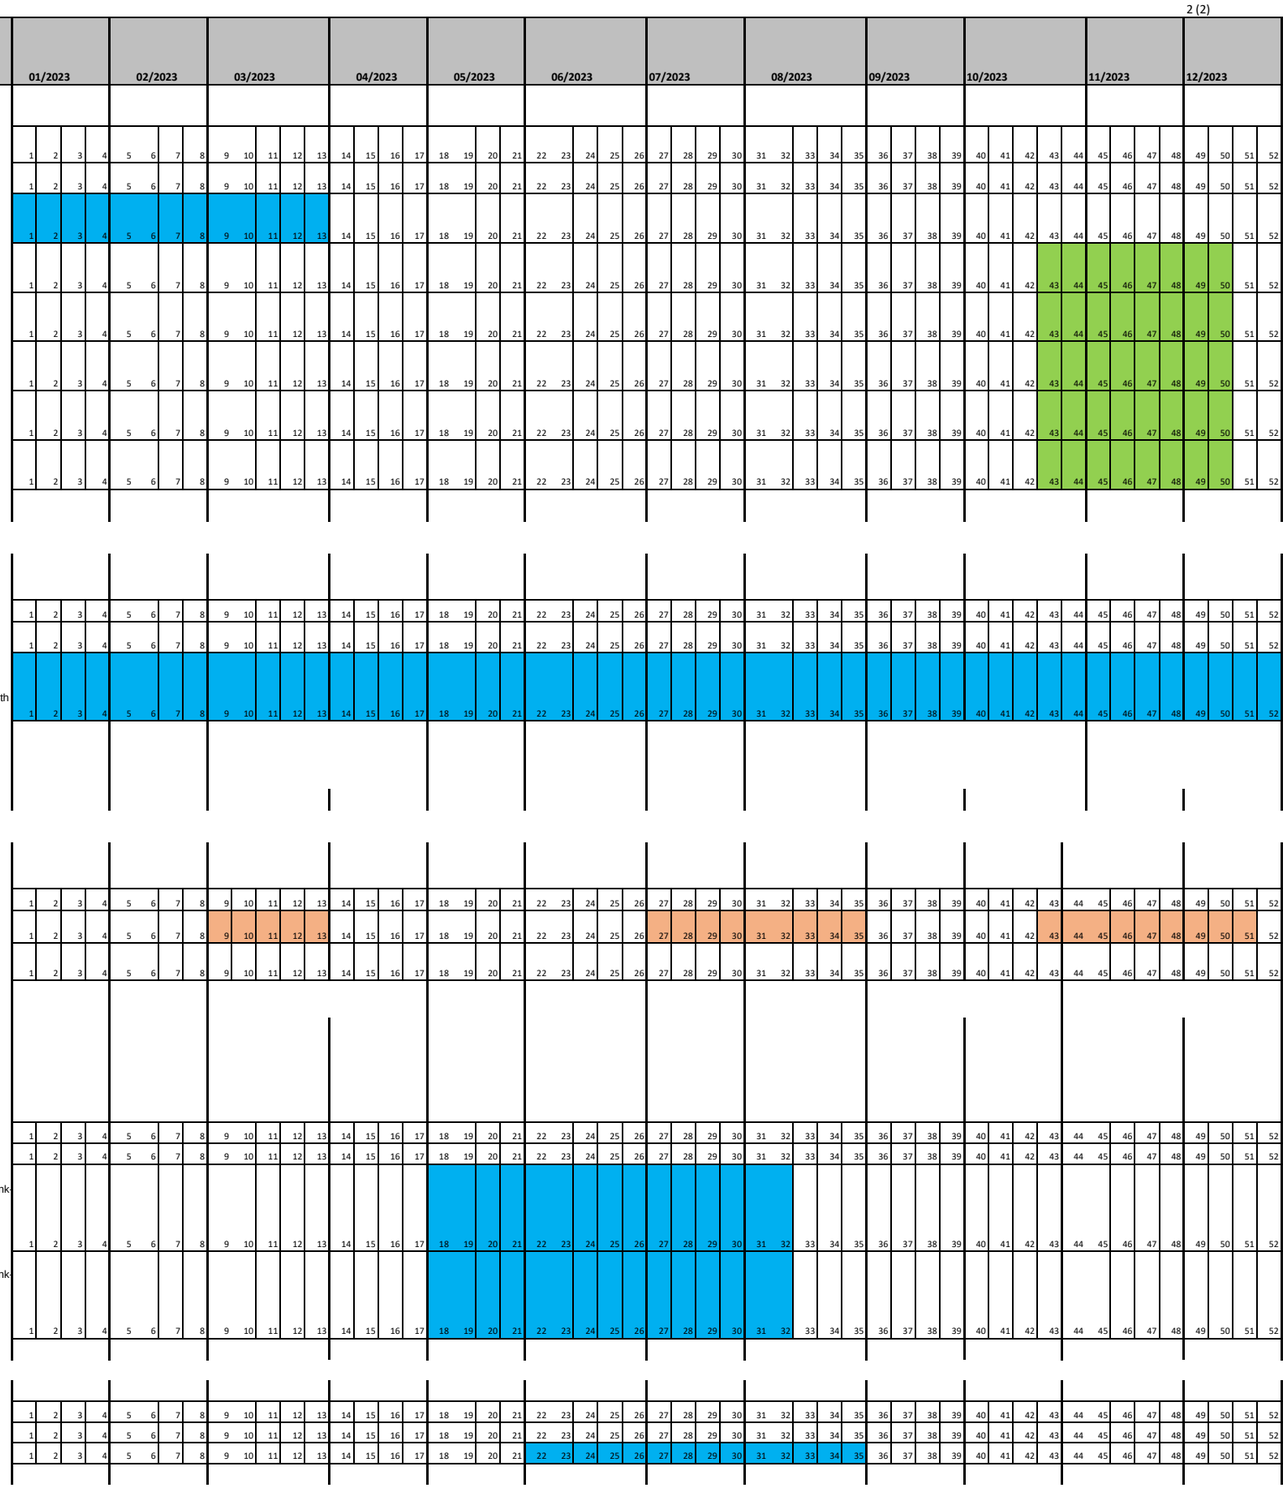

PARGAS KOMMUNOMRÅDE, GRUNDREPARATIONER - PARAISTEN KUNTA-ALUE, PERUSKORJAUKSET 2023

tarjouspyynnöt | suunnitteluvaihe | tuntityö | urakkatyö | Muutos

14.11.2023

Salkutus lka	Vastuunjako	Kustannuspaikka ja projektinumero	Kohde		Talousarvio+TA lisäbudjetti yhteensä €	Toteutuma urakkahinta €, kertymä viikolle 46	Ennuste €	Toteutuma %	
A	JEn,SPi	4168.8461	Hammashoitola/rakennekorjaus						
				suunnittelu	0 €	0 €	0 €	0 %	
				tuntityö	10 000 €	3 305 €	10 000 €	28 %	SMM Capital Oy, Plåtslageri Lindström, Stark Suomi Oy, Kattotyö Jari Virta Oy
				urakkatyö	0 €	0 €	0 €	0 %	
			Yhteensä		**10 000 €**	**3 305 €**	**10 000 €**	**28 %**	
			Kaikki yhteensä		**438 724 €**	**444 671 €**	**476 400 €**	**68 %**	**Kokonaistoteutuma**

01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25 26	27 28 29 30	31 32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43	44 45 46 47 48	49 50 51 52
1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25 26	27 28 29 30	31 32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43	44 45 46 47 48	49 50 51 52
1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25 26	27 28 29 30	31 32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43	44 45 46 47 48	49 50 51 52
1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25 26	27 28 29 30	31 32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43	44 45 46 47 48	49 50 51 52

Salkut

lka	Käyttötarkoitus
A	Pidettävät rakennukset
B	Kehitettävät rakennukset
C	Realisoitavat eli myytävät rakennukset
C+	Realisoitavat tai käyttötarkoituksen muutos
D	Purettavat rakennukset
